

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTR. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Entidad federativa: Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
Claveinst 911 18MSU0019M		Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-211-88-05
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx , aldoverdin@hotmail.com	er407@hotmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión							Femenino	Masculino	Total	Profesores
						Programada	Programada	Programada	Programada																							
	MODIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES, PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura física de Educación Media Superior.	5,540,888.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44						Acaponeta Nay.			
Total		5,540,888.00		1,008.02																525	414	939	44									

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		E
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com		er0407@ho
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA O					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.


FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
-88-05	
tmail.com	

BRA	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación/ Ampliación	Espacios educativos																					
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento			AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS	
					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
Dirección Postal completa			X		21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS
	0.00	0.00			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	

FOTOS ACTUALES

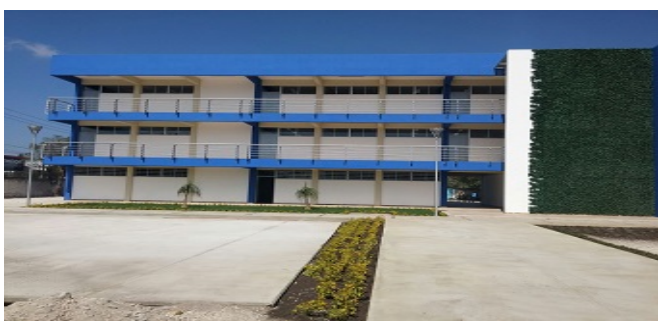

TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Nombre de la institución:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico	amcape@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
Clavelnst911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Justificación en el ProGES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de medicina de sueños	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician				Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada	
						7 PROGRMAS: PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.		Beneficia a alumnos de Posgrado	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	Si	ProGES Proyecto: 4.4 Infraestructura; pagina 85																		
Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	200,000.00		100%														674	1220	1894			18/07/16	25/07/16					
Total	200,000.00	200,000.00	0.00																	2,137									

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

Información General de la Institución		Planeación				Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	M.A. Pedro Amiero Casillas				Arq. Ernesto Navamete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre:	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional				Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Cargo:	311-2-11-88-00 ext 8786				311- 2-11-88-05	
Nayarit	Teléfono:	aricape@hotmail.com				er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911	Correo electrónico:						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario c						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos si/ctvs.)	Monto total ejercido	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio		
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síctls)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síctls)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel Medio Superior.	2,037,591.97	2,037,591.97		100%																									
	Total	2,037,591.97						0.00																						

OBSERVACIONES	
A la fecha se estan realizando los procedimientos para la ejecución del recurso	RETENCIONES
DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,460,002.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,700.00 A EQUIPAMIENTO.	
Durante el mes de febrero se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 6,090.90	
Durante el mes de MARZO se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 1,303.82	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016
 INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARO. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:	NAYARIT	Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800 8638
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIAI									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos							
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centa.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura					Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%																							184	358	542
	Total	118,563.84																												

OBSERVACIONES	
La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.	
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa. del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94	
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94	
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO	
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.	
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.	

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

AULAS DIDÁCTICAS			ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
										0	0.00																																	0	0.00			
0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	

